



Дунав мост при Видин – Калафат



Стойност на обекта **226 млн. евро**
За строителството на моста **163 млн.**
Срок на строителството **38 месеца**

Дейности по подготовката на проекта

- **Предистория**
- **Състояние към момента**
- **Планирани дейности**

Дейности по подготовката на проекта Значение на проекта

- Чрез проекта се създава липсващата връзка по трасето на Коридор № 4
- Проектът има важно социално-икономическото значение за региона
- Проектът е в приоритетния списък на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа
- Подкрепен от ЕК (програмите PHARE и ISPA), ЕИБ, Кредитна институция за възстановяване на ФРГ (KfW), Френската агенция за развитие (AFD)

3

Дейности по подготовката на проекта Финансиране на проекта

Обща стойност на проекта – €226М

- €70М – грант от ИСПА;
- €70М – заем от ЕИБ;
- €5М – грант от AFD;
- €18М – заем от KfW;
- €2,045М – грант от KfW;
- €60,76М – Държавен бюджет


4

Дейности по подготовката на проекта Предистория

- 1 януари 2003 - Международният консултант по инженеринг и управление (МКИУ) пое своите задължения
- 12 юли 2003 - МКИУ представи доклада за предварителния проект.

5

Дейности по подготовката на проекта

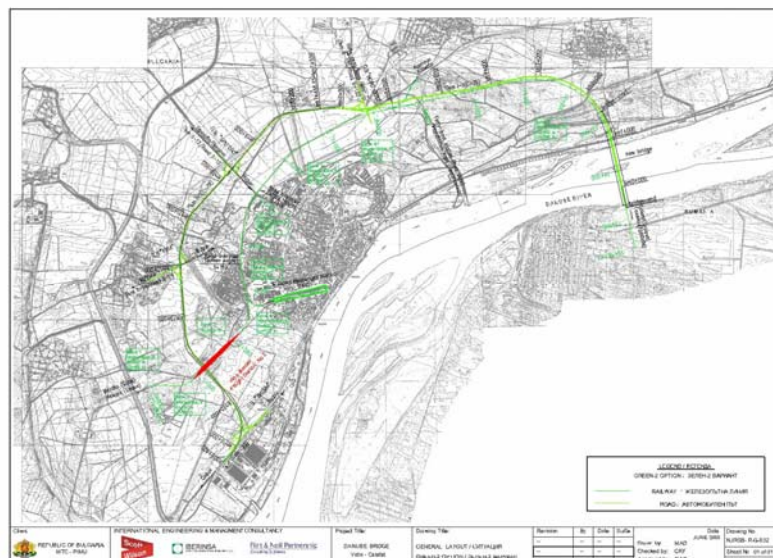


6

Дейности по подготовката на проекта




Дейности по подготовката на проекта




Дейности по подготовката на проекта

Вариант 2



Дейности по подготовката на проекта



Дейности по подготовката на проекта Предистория

- 2004 - Консултантът представи доклада с изследванията за хидроложкия модел, изготвен за проектирането и строителството на новия мост при Видин – Калафат.
- 17 септември 2004 - германската фирма ERM GmbH, представи проект на окончателен доклад по ОВОС за моста и прилежащата българска и румънска инфраструктура.

11

Дейности по подготовката на проекта Предистория

- 2004 - след обществените обсъждания във Видин и Калафат, в края на годината са издадени съответните екологични разрешителни за проекта от двете страни.
- 10 декември 2004 - техническият проект за прилежащата инфраструктура на моста е одобрен от Националния експертен съвет по устройство на територията.
- 23 ноември 2004 - Министерският съвет издава решение за отчуждаване на 6 имота за строителната площадка на моста.
- 29 декември 2004 – излиза решение на Министерския съвет във връзка с отчуждаването на имоти с приблизителна площ 130 хектара (228 имота), необходими за прилежащата инфраструктура.

12

Дейности по подготовката на проекта Състояние към момента

- 2 септември 2005 - Тръжното досие за консултантски услуги за независим надзор на строителството и независим контрол на проектирането на моста е внесено в Делегацията на ЕК (ДЕК) за одобрение.
- 19 септември 2005 - Тръжното досие за строителство и проектиране на моста е внесено за одобрение от ДЕК

13

Дейности по подготовката на проекта Състояние към момента

- 18-ти октомври 2005 - одобрен докладът на комисията по изготвянето на късата листа за строител на моста. От общо 15 кандидати са определени 6 (шест) фирми, които ще бъдат поканени да представят своите оферти за строителството на моста.
- 9 Ноември 2005 - след двегодишно прекъсване е проведено поредното заседание на Управляващия комитет за строителството на моста.

14

Дейности по подготовката на проекта Състояние към момента

- 2005 - даден е ход на отчуждителните процедури на имоти за нуждите на прилежащата инфраструктура.
- Ноември 2005 - със съдействието на местните власти 90% от работата по отчужденията е приключена успешно

15

Дейности по подготовката на проекта Планирани дейности

- 24 ноември 2005 – провеждане на 7-мото заседание на Смесения българо-румънски комитет за управление на проекта.
- 24 ноември 2005 – паралелно с работата на Смесения българо-румънски комитет провеждане на първо заседание на 10-та смесена работна група по въпросите за създаване на орган за съвместно управление и поддръжка на граничното съоръжение.

16

Дейности по подготовката на проекта

Планирани дейности

- 2005 - Одобрение на Тръжното досие за проектиране и строителство на моста и покана към фирмите от късата листа да изготвят техните оферти.
- 2006 - Избор на комисия и изготвяне на доклад за избор на изпълнител на моста и одобрение от ДЕК в София.
- май 2006 – сключване на договор за проектиране и строителство на моста

17

Дейности по подготовката на проекта

Планирани дейности

- 2005 - Решение на Министерския съвет за отчуждаване на имоти за прилежащата инфраструктура в землището на град Видин.
- 2005 - Одобрение на Тръжното досие на Консултант за независимия надзор и контрол на проектирането и публикуване на обявата за предквалификация.
- 2006 - Избор на комисия и изготвяне на доклад по предквалификацията на консултантските фирми за надзор и контрол на проектирането на моста.
- 2006 - Избор на Консултант – Инженер по FIDIC за строителството на моста.

18

Дейности по подготовката на проекта

Планирани дейности

- 2006 – Одобрение на Тръжното досие за строителство на прилежащата инфраструктура.
- 2006 - Одобрение на Тръжното досие на Консултант за независимия надзор за строителство на прилежащата инфраструктура.
- 2006 – Стартиране на тръжни процедури за избор на изпълнител и на консултант за независимия надзор за строителство на прилежащата инфраструктура.
- 2007 – Сключване на договори за строителство на прилежащата инфраструктура.
